

Iunie 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2026-06 · generat la 2 octombrie 2026

12

Etapă în lună

0

Recepții

1

Lucrări și proiectări pornite

0

Contracte și acte

1

Opriri

0

Reluări

Lucrări și proiectări pornite **1**

Ordine de începere a proiectării sau a execuției.

+ 11 iunie 2026 **Început** + Sănătate

Sanatoriul Podriga – pavilion reabilitat și cantină nouă (CONNECT)

Ordinele de începere a lucrărilor — două loturi, 6,24 milioane de lei în total; termen de cel mult 12 luni
6,2 mil. lei fără act publicat încă

Oprite **1**

Ce s-a oprit în lună și de ce.

II 30 iunie 2026 **Oprit** 🏛️ Cultură

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Proiectul așteaptă finalizarea unui litigiu pe terenul vecin — documentația pentru autorizație, depusă la Primăria Botoșani; acordul se emite după litigiu

19,5 mil. lei 📄 Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani

Stadii raportate **10**

Procente de execuție raportate oficial.

valeruiftime.ro · raport lunar

pagina 1 din 6

- 30 iunie 2026 **Stadiu**  Educație

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Stadiu fizic 35% — CNI reduce ritmul de finanțare cu 50% pentru 2026

16,1 mil. lei fără act publicat încă

- 30 iunie 2026 **Stadiu**  Cultură

Reabilitarea imobilului din Calea Națională 64 – Biblioteca Județeană

CNI cere avizul ISU și completarea expertizei tehnice — urmează achiziția documentației pentru avizul ISU, cu termen estimat de 90 de zile

25,3 mil. lei  Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani

- 30 iunie 2026 **Stadiu**  Cultură

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Stadiu fizic 76% — contractul de lucrări urmează să fie prelungit

30,1 mil. lei  Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani

- 30 iunie 2026 **Stadiu**  Sănătate

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Stadiu fizic 18% — CNI reduce ritmul de finanțare cu 50% pentru 2026

25,4 mil. lei fără act publicat încă

- 30 iunie 2026 **Stadiu**  Sănătate

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Stadiu fizic 44%, financiar 42% — CNI a cerut reducerea ritmului cu 50% pentru 2026

54,3 mil. lei fără act publicat încă

- 30 iunie 2026 **Stadiu**  Drumuri

DJ 291D – Oroftiana – Baranca – Bajura

Stadiu fizic 65% — carosabil și balast 100%, poduri și podețe 60%

40,2 mil. lei fără act publicat încă

- 30 iunie 2026 **Stadiu**  Drumuri

DJ 294C – Borolea – Hănești

Stadiu fizic 65% — decontat: 10,5 milioane de lei

36,9 mil. lei fără act publicat încă

- 30 iunie 2026 **Stadiu** Drumuri

DJ 293 – Mileanca – Codreni – Puțurenii – Coțușca

Stadiu fizic 70% — decontat: 42,3 milioane de lei

78,4 mil. lei fără act publicat încă

- 29 iunie 2026 **Stadiu** Cultură

Monumentul comemorativ al accidentului de la Huțani

Construcția monumentului ajunge la circa 85% — termenul asumat, 15 aprilie 2026, a fost depășit

fără act publicat încă

- iunie 2026 **Stadiu** Energie

Renovarea integrată a sediului Serviciului Public de Evidență a Persoanelor

Comunicatul de finalizare a proiectului PNRR — valoare finală: 4.259.977,80 lei

4,3 mil. lei Comunicat CJ Botoșani – finalizarea proiectului

Proiectele atinse în lună **12**

Împreună, 336,8 mil. lei.

Sănătate

6,2 mil. lei

Sanatoriul Podriga – pavilion reabilitat și cantină nouă (CONNECT)

draguseni

În execuție

Cultură

19,5 mil. lei

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

botosani

Planificat

Educație

16,1 mil. lei

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

botosani

În execuție

35%

Cultură

25,3 mil. lei

Reabilitarea imobilului din Calea Națională 64 – Biblioteca Județeană

botosani

Planificat

Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

botosani

În execuție

76%

Sănătate


25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

botosani

În execuție

18%

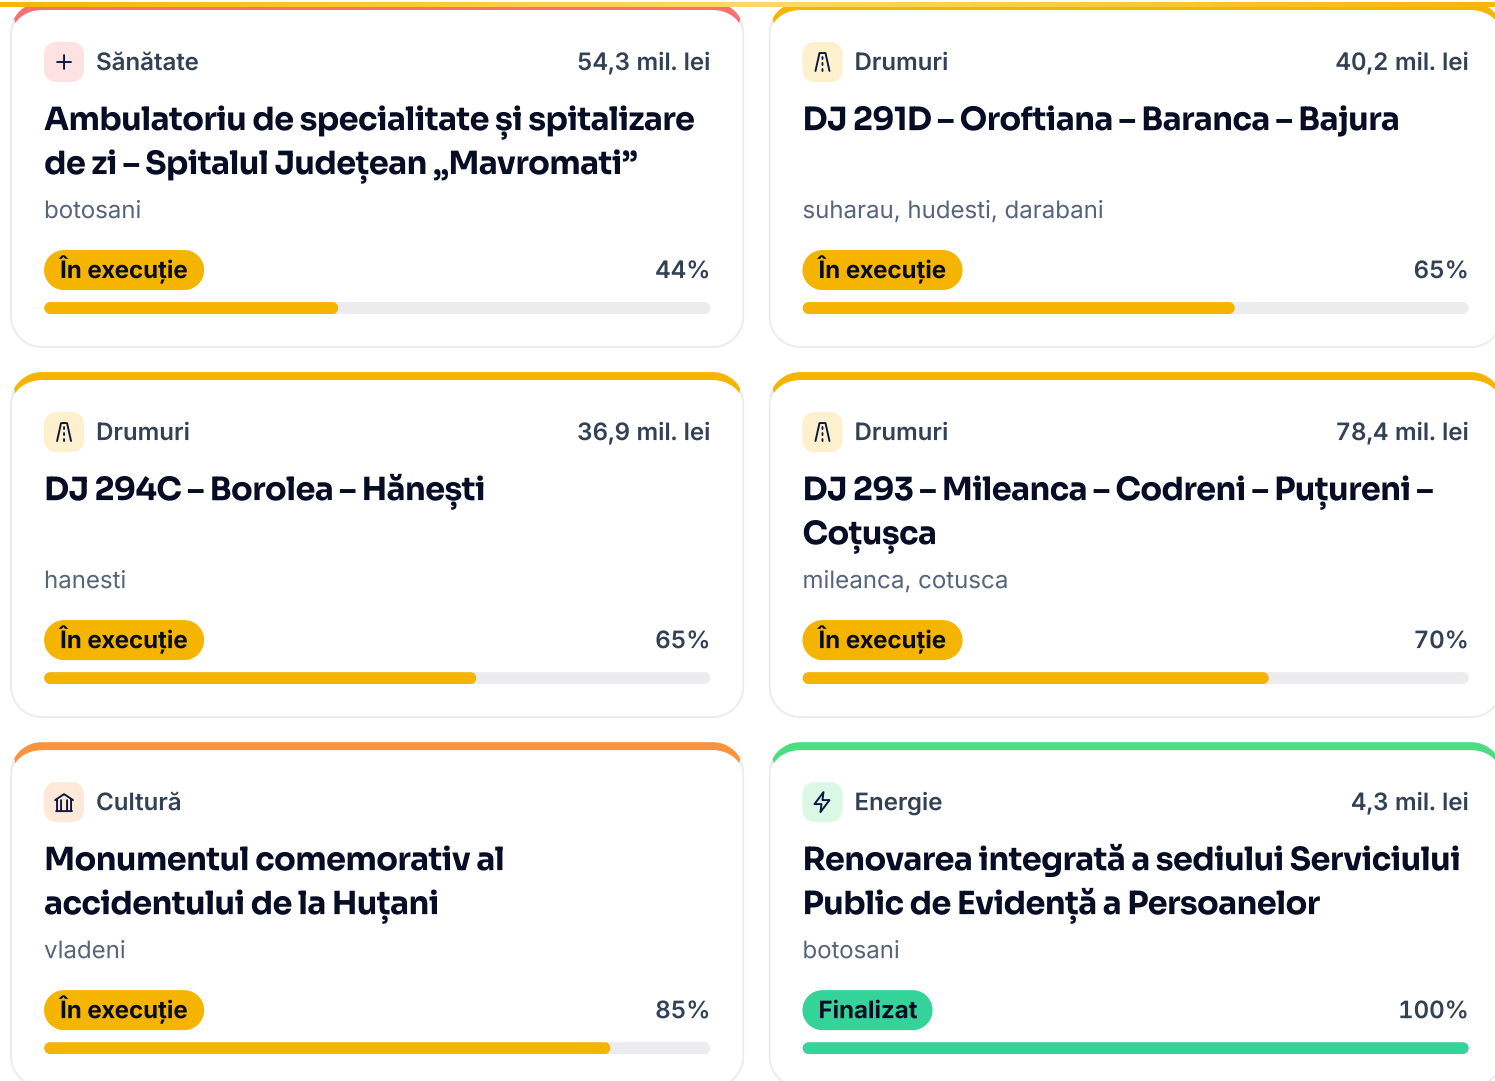

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.



Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate


Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte

Documentele citate **2**

1. Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani, 1 iulie 2026 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2026/07/MACHETA-stadiul-investitiilor-la-30.06.2026.pdf>
2. Comunicat CJ Botoșani – finalizarea proiectului, 1 iunie 2026 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2026/06/PNRR-COMUNICAT-DE-PRESA-finalizare-PNRR-SPCEP.pdf>

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.
